

SUDOE

Programa de Cooperación Territorial
Programme de Coopération Territoriale
Programa de Cooperação Territorial
Territorial Cooperation Programme

Interreg IV B
www.interreg-sudoe.eu



Bonne pratique en suivi et évaluation PROJET AGUA FLASH

José Miguel Sánchez Pérez
DR CNRS, Toulouse, France



Santander 7-8/02/2011



AGUA FLASH

Développement d'une méthode d'évaluation des risques de dégradation de la qualité des eaux dans les bassins versants agricoles au cours de crues transposables aux bassins versants du SUDOE.


www.aguaflash-sudoe.eu

Objectif :

Développer un prototype qui permettra l'évaluation des risques de dégradation de la qualité des eaux dans des périodes de crues des bassins agricoles du SUDOE.



Dégradation de la qualité de l'eau de surface Avec prise en compte des épisodes de crue

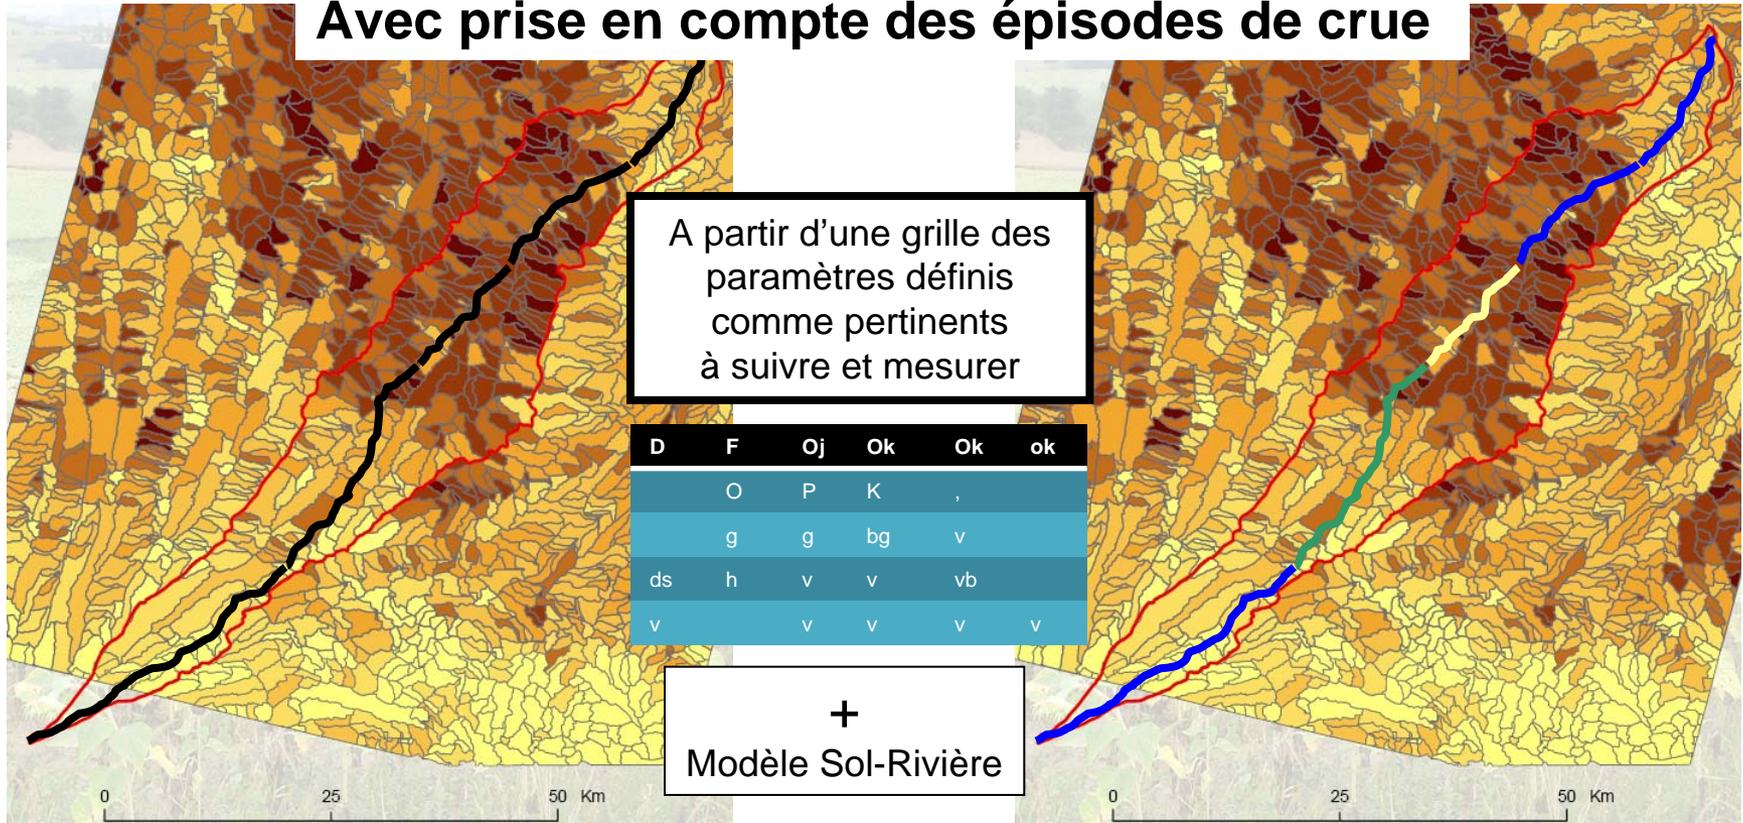


Détermine les zones potentielles de dégradation des eaux de surface

BENEFICIARIO PRINCIPAL

1. CNRS - Laboratoire d'écologie fonctionnelle de Toulouse (ECOLAB) (FR)

BENEFICIARIOS

2. Universidad del País Vasco (ES)
3. Agencia Estatal de Investigación CSIC - Instituto Pirenaico de Ecología (ES)
4. CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts - Groupement de Bordeaux (FR)
5. Institut National Polytechnique de Toulouse (FR)
6. INRB - Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P. (PT)

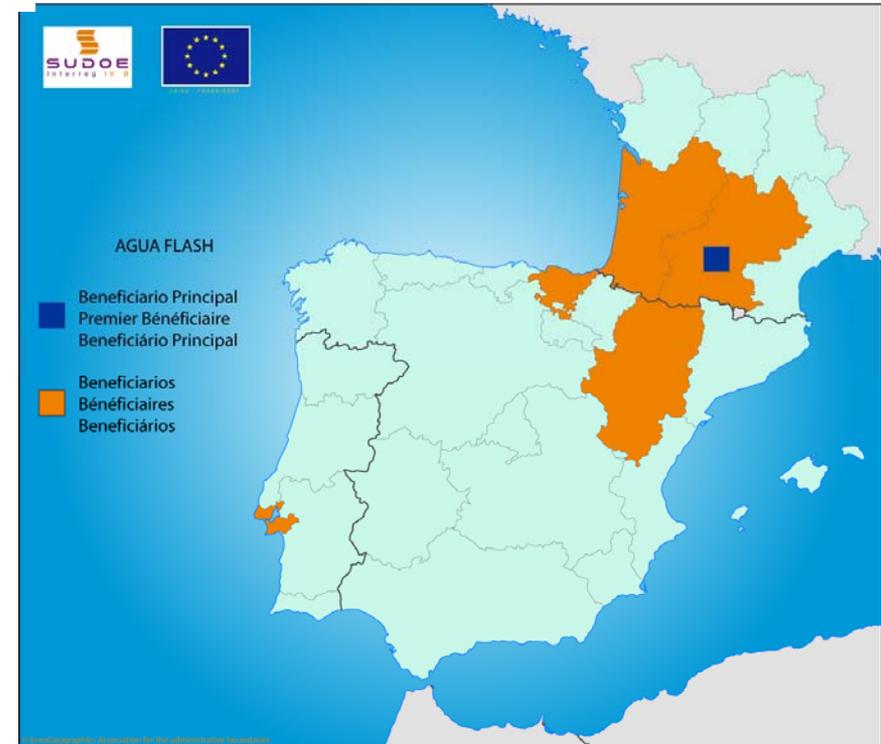

Coste total : 1.396.445,32 €
FEDER: 1.047.333,99 €



Inicio : 04/2009
Fin : 03/2012



Organisation du projet en groupe de tâches

- **Tâche 1 : Coordination et Gestion du projet. CNRS**
- **Tâche 2 : Collecte et analyses des données. CSIC**
- **Tâche 3 : Détermination des zones potentielles de contamination des eaux de surface sur des BV agricoles. CEMAGREF**
- **Tâche 4 : Evaluation de l'impact des crues sur les milieux aquatiques. INP**
- **Tâche 5 : Méthode d'évaluation des risques de dégradation des eaux de surface dans le domaine SUDOE. INRB**
- **Tâche 6 : Suivi et évaluation du projet. CNRS**
- **Tâche 7 : Publicité, information et capitalisation du projet. CNRS.**



4 Sites d'étude représentatifs des zones à agriculture intensive





PHASE 1

GT2 : Données d'entrée
(caractéristiques
environnementales)
BV + rivière

GT4 : Modélisation
(rivière)

GT3 : Carte de potentialité
de risques
(pesticides, azote, ...) BV

PROTOTYPE

Données d'entrée
(indicateurs
environnementales
sélectionnées)

Relations

Bio

Carte de zones
de dégradation
de la qualité des eaux
dans le réseau hydrographique



Tâche 1 : Coordination et Gestion du projet.

- **Comité de Direction (représentant des partenaires).**
- **Comité technique (Leader de tâches).**
- **Comite consultatifs (Acteurs socio-économiques).**

7 réunions dont 3 la première année :

- Réunion de lancement en Avril 2009.
- Réunion de cadrage validation des indicateurs (Juin 2009)
- Réunions semestrielles.
(octobre 2009, mars et octobre 2010, mars et octobre 2011).
- Réunion de clôture finale (mars 2012).

Tâche 6 : Suivi et évaluation du projet

GT 6.1 : Arrêt des indicateurs de réalisation

Le CD aura à sa disposition des indicateurs de réalisation du projet qui seront arrêtés, au cours du 1er semestre.

GT 6-2 : Renseignement des indicateurs.

Le chef de projet veillera à ce que les indicateurs soient renseignés par les participants au moins deux mois avant la tenue du CD annuel d'évaluation.

GT 6-3 : Réunion annuelle d'évaluation.

Lors de la réunion annuelle du CD consacrée à l'évaluation, le chef de projet présente les indicateurs.



Présentation des indicateurs SUDOE (12 mois de projet).

Indicateurs de réalisation	Unité	Objectif prévu	Objectif atteint 31/03/2010	
		valeur	valeur	%
A.2.4 Projets sur la prévention de risques (N°)	Nombre	1,00	0,00	0,00 %
Indicateurs de résultat	Unité	Objectif prévu	Objectif atteint 31/03/2010	
		valeur	valeur	%
B.2.3 Systèmes de prévision et de surveillance créés (N°)	Nombre	1,00	0,00	0,00 %
Indicateurs d'impact	Unité	Objectif prévu	Objectif atteint 31/03/2010	
		valeur	valeur	%
C.2.1 Elaboration d'instruments conjoints d'aménagement des ressources naturelles (N°)	Nombre	1,00	0,00	0,00 %
C.2.3 Taux de couverture de la population bénéficiaire de la réalisation d'actions de prévention (%)	%	50,00	30,00	60,00 %



Présentation des indicateurs (6 mois de projet).

Indicateurs	Renseignements
Respect du calendrier	-Fin des GT2.1, GT6.1 et GT 7.1 au 30/09/2009 -Début des GT 4.1 et GT6.2 au 01/10/2009
Taux de réalisation des dépenses	11,74% 163 978,70€ dépensés sur un cout total éligible de 1 396 445,32€
Taux de synergie entre les équipes et entre les pays	Nombre de mails échangés: 1966 Nombre de réunion/homme: 40 Nombre de visio-conférences: 0 Nombre de visites sur le Terrain/homme : 13
Relations avec l'extérieur	Nombre d'organismes sollicitées au CC Nombre de visites sur le site Internet Nombre d'organismes partenaires du projet
Potentiel d'atteinte de l'objectif du projet	Taux de croissance des partenaires qui adhèrent à l'objectif du projet



Présentation des indicateurs (12 mois de projet).

Indicateurs	Renseignements
Respect du calendrier	<ul style="list-style-type: none"> - Bilan première année du projet : les livrables ont été obtenus dans les délais fixés dans le formulaire de candidature
Taux de réalisation des dépenses	<ul style="list-style-type: none"> - Octobre 2009 : 11,74% (163 978,70€ dépensés) - Mars 2010 : 14,03 % (196 003,01€ dépensés) sur un cout total éligible de 1 396 445,32€
Relations avec l'extérieur	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de visites sur le site Internet : 2321 - Nombre d'organismes partenaires du projet : 8




Présentation des indicateurs (18 mois de projet).

Indicateurs	Renseignements
Respect du calendrier	- Retard d'environ 1 mois dans la demande de remboursement des dépenses pour la 1ere année
Taux de réalisation des dépenses	- Octobre 2010 : 58,25%
Relations avec l'extérieur	- Nombre de visites sur le site Internet : 6528 - Nombre d'organismes partenaires du projet : 10




Présentation des indicateurs d'évaluation du projet (01/04/2009 au 31/03/2010 = 12 mois)

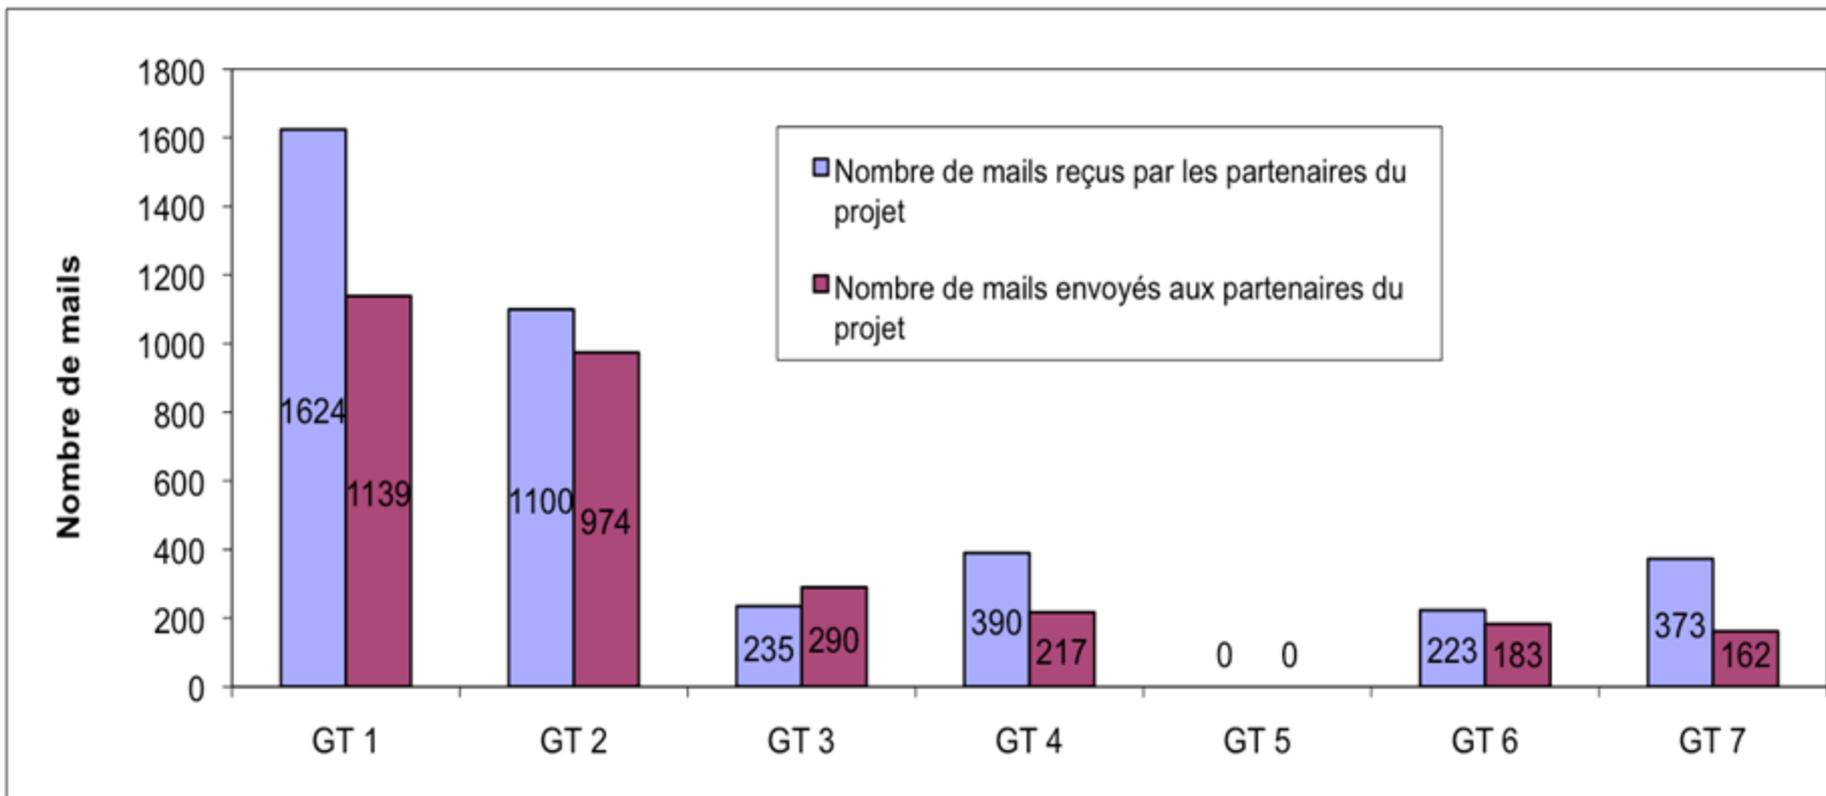




Présentation des indicateurs d'évaluation du projet (01/04/2009 au 31/03/2010)

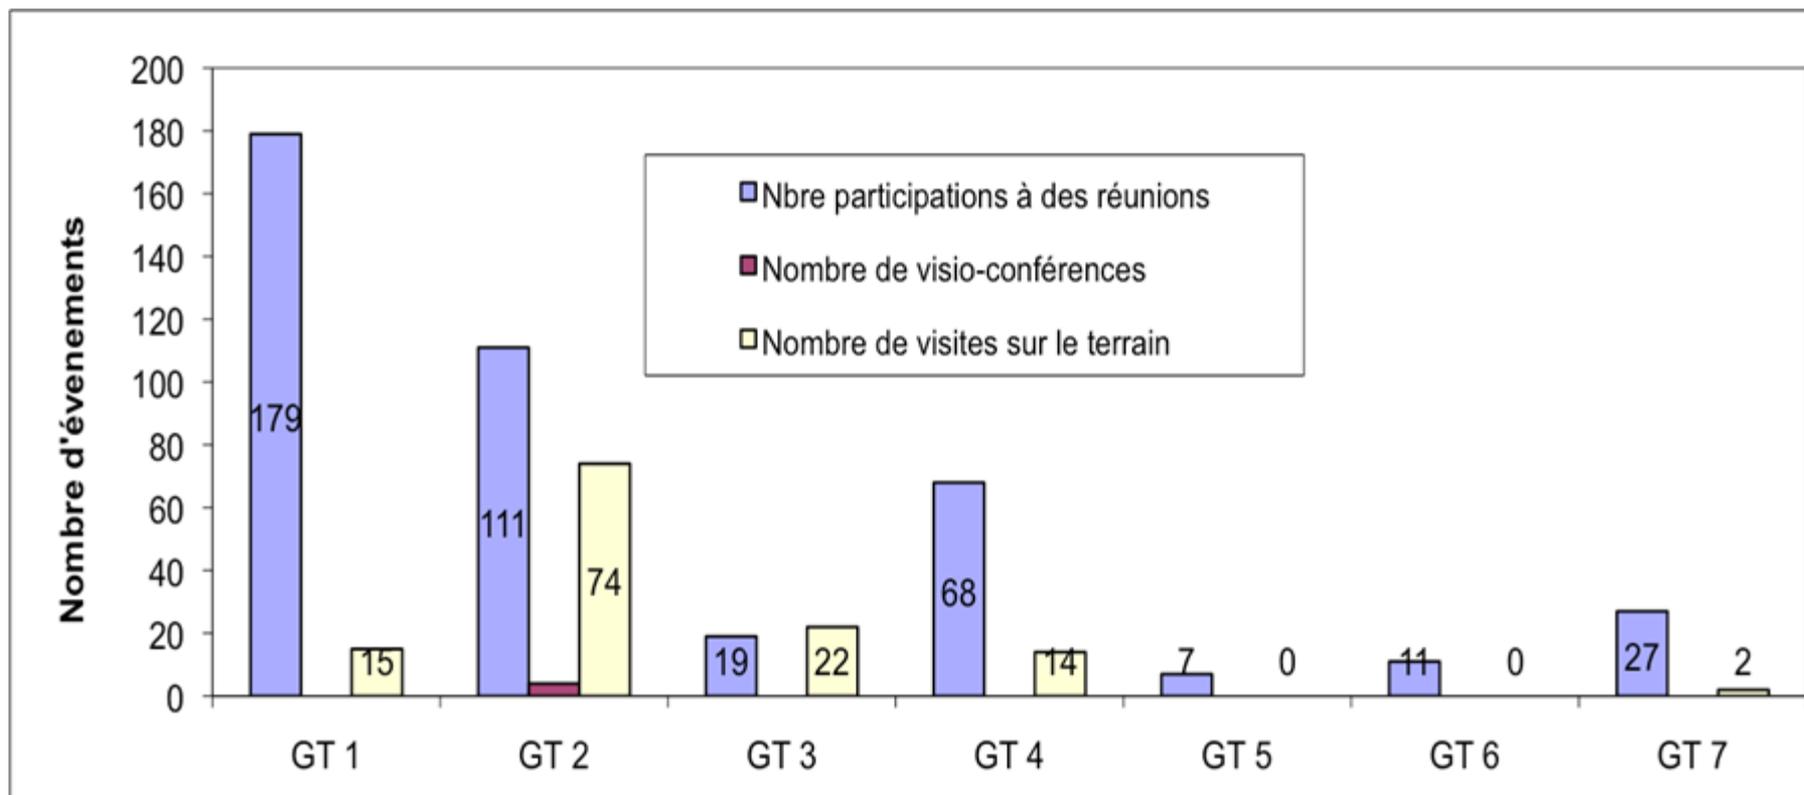



Présentation des indicateurs par GT (01/04/2010 au 30/09/2010 = 6 mois)

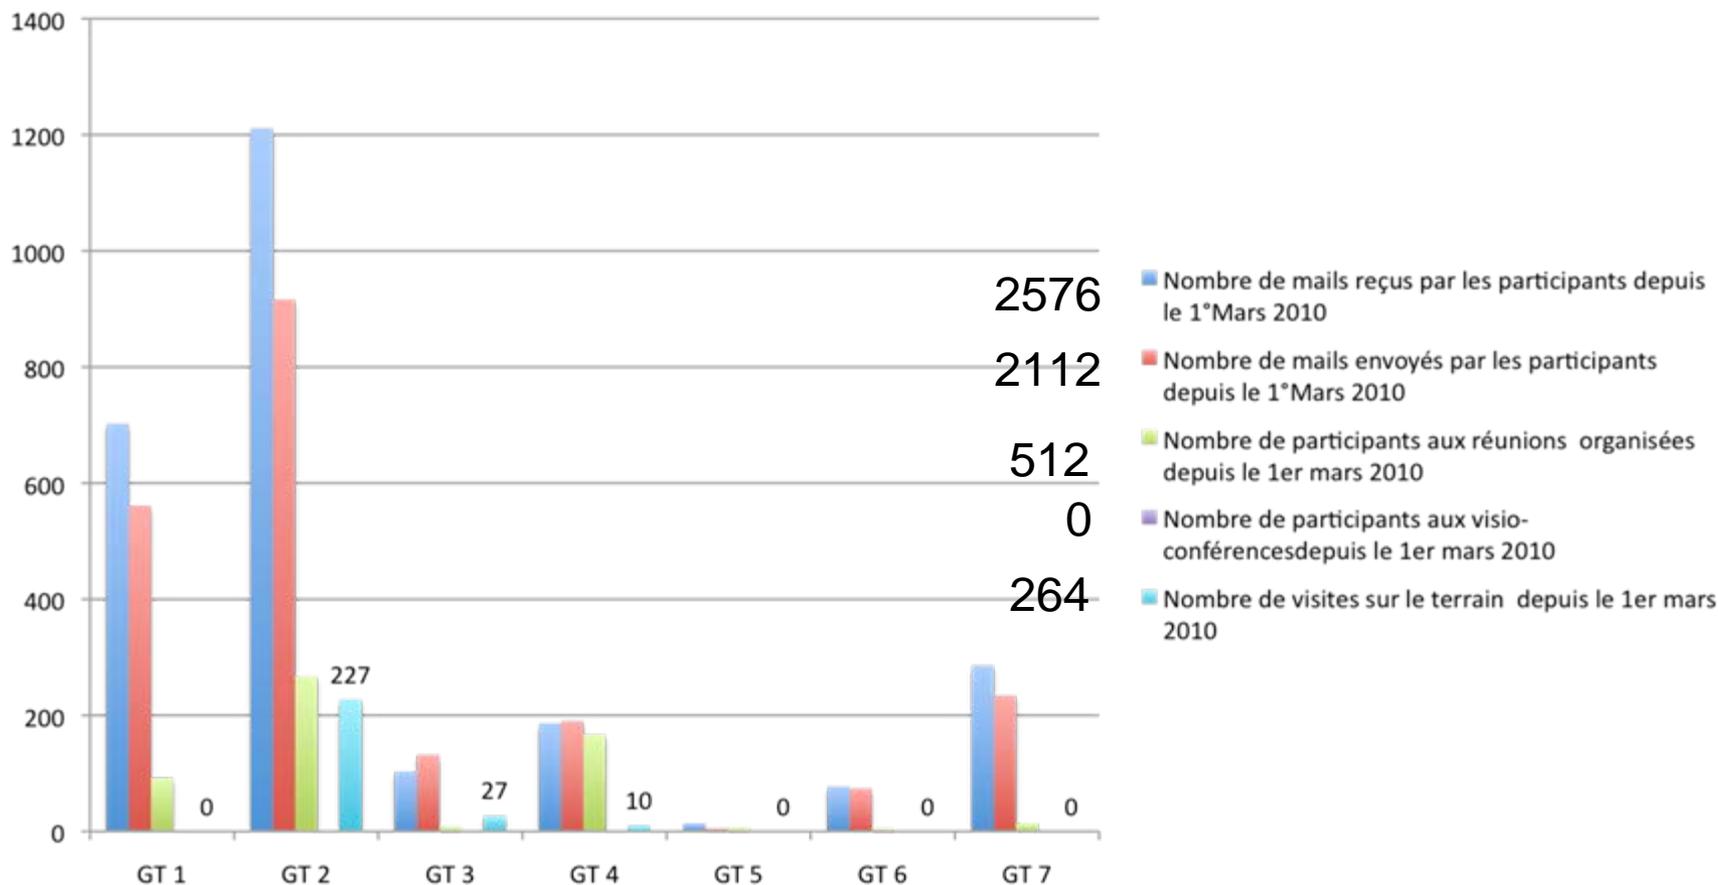



Conclusions

- Les indicateurs obligatoires sont mal adaptés à notre projet.
- Les indicateurs que nous avons proposé nous ont permis de mieux analyser les synergies entre partenaires, d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de anticiper certains problèmes de calendrier et de respect des dépenses.



Merci, Gracias, Obrigado

Partenaires



Ministério da
Agricultura
do Desenvolvimento
Rural e das Pescas

INRB, I.P.
Instituto Nacional
dos Recursos Biológicos, I.P.

Partenaires associés



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO



ARH
ALENTEJO

Administração da
Região Hidrográfica
do Alentejo I.P.



MINISTÉRIO DO AMBIENTE,
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



EUSKO JAURLARITZA

INGURUMEN, LURRALDE
PLANGINTZA, NEKAZARITZA
ETA ARRANTZA SAILA



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Nekazaritza Saila
Departamento
de Agricultura
