

**EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL**  
**PROGRAMA DE COOPERACIÓN**  
**TRANSNACIONAL DEL ESPACIO DEL**  
**SUDOESTE EUROPEO (SUDOE) 2007-2013**

Presentación de los principales resultados del estudio

Toulouse, 22 de noviembre de 2011

## ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

**1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**

**2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN**

**3. PRINCIPALES CONCLUSIONES OBTENIDAS**

## 1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

### OBJETIVOS:

---

- ✦ Evaluar los posibles impactos del cambio socioeconómico de la zona SUDOE desde el contexto descrito en el programa operativo aprobado en septiembre de 2007.
- ✦ Evaluar la eficacia y los efectos socio-económicos esperados del Programa SUDOE respecto a los objetivos fijados en el Programa Operativo.
- ✦ Elaborar propuestas para la ejecución del Programa SUDOE y formular recomendaciones para las próximas Convocatorias de proyectos.

## ALCANCE :

---

Actualización  
del Diagnóstico  
del Programa

Territorio / Sistema económico / Mercado de Trabajo /  
Estruct. Productiva / I+D / Medio Ambiente / ...

Validez de la  
Evaluación  
Previa

Revisión de la Pertinencia / Coherencia / Valoración de las  
sinergias del Programa / Contribución a la Estrategia 2020

Análisis de la  
Ejecución

Sist. Gestión / Eficacia (financiera y física) / Eficiencia /  
Cumplimiento de objetivos

Impactos y  
propuestas de  
mejora

Estimación de Impactos / Capitalización / Conclusiones y  
recomendaciones (¿modificación?) / Buenas Prácticas

## 2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

- ✦ Orientación hacia los objetivos de la Evaluación. Atención a las orientaciones de la Comisión Europea (DT N° 5).
- ✦ Combinación de técnicas de obtención y tratamiento de datos de tipo CUANTITATIVO y CUALITATIVO.
- ✦ No se han encontrado limitaciones de información: Enfoque participativo que ha permitido contrastar resultados y enriquecer las valoraciones.

PLANTEAMIENTO DE  
SOLUCIONES METODOLÓGICAS



ANÁLISIS CUANTITATIVO

ANÁLISIS CUALITATIVO

## ANÁLISIS CUALITATIVO:

---

- + Análisis documental: Documentos de programación, seguimiento y apoyo a la gestión.
- + Cuatro entrevistas y/o reuniones con los organismos responsables en la gestión del Programa: AG, STC y Corresponsales Nacionales.
- + Encuestas a beneficiarios principales.

COLECTIVO / GRUPO	POBLACIÓN	Nº DE ENCUESTADOS	ERROR DE MUESTREO
Beneficiarios	74	67	5%

## ANÁLISIS CUANTITATIVO:

---

- + Estudio de los Indicadores de seguimiento
- + Explotación estadística de las encuestas para la valoración de impactos y cumplimiento de los objetivos.

### 3. PRINCIPALES CONCLUSIONES OBTENIDAS

#### ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO:


---

- ✦ EMPEORAMIENTO DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN EL CONJUNTO DEL SUDOE, EN PARTICULAR EN DETERMINADAS REGIONES DE PORTUGAL Y ESPAÑA.
- ✦ PROCESO DE CONVERGENCIA LIGERO EN TÉRMINOS DE RENTA Y MÁS INTENSO EN PRODUCTIVIDAD.
- ✦ CRECIENTE DESEMPLEO, SOBRE TODO EN ALGUNAS REGIONES ESPAÑOLAS, Y PÉRDIDA DE TEJIDO EMPRESARIAL.
- ✦ AJUSTE SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
- ✦ ELEVADA CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DEL GASTO EN I+D Y PROGRESIVA INCORPORACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SUDOE.
- ✦ ESCASO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LISBOA (País Vasco y Midi-Pyrénées = 80%)

## VALORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA:

- ✦ Estrategia basada en objetivos centrados en materia de cooperación y de desarrollo regional.
- ✦ Potenciación de los factores avanzados y especializados a partir de procesos de innovación dentro de la estrategia.


GRÁFICO 1. INCORPORACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA I+D+I Y LAS NTIC EN LA PROGRAMACIÓN

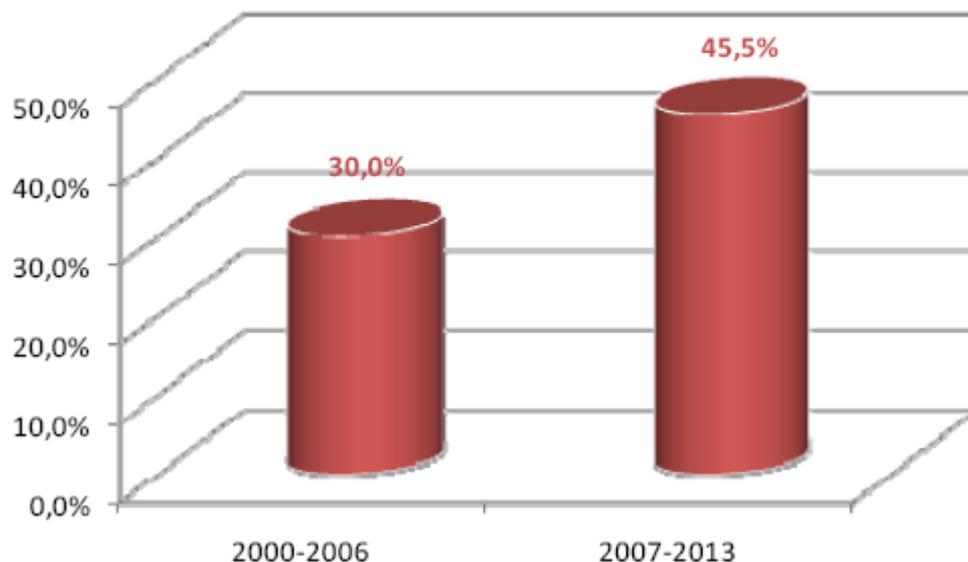

## VALORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA:

### ✦ APLICACIÓN PERTINENTE DE LA ESTRATEGIA

GRÁFICO 2. COBERTURA DE LOS PRINCIPALES ÁMBITOS EN LOS QUE EXISTEN DETERMINADAS PROBLEMÁTICAS POR LOS PROYECTOS DEL SUDOE

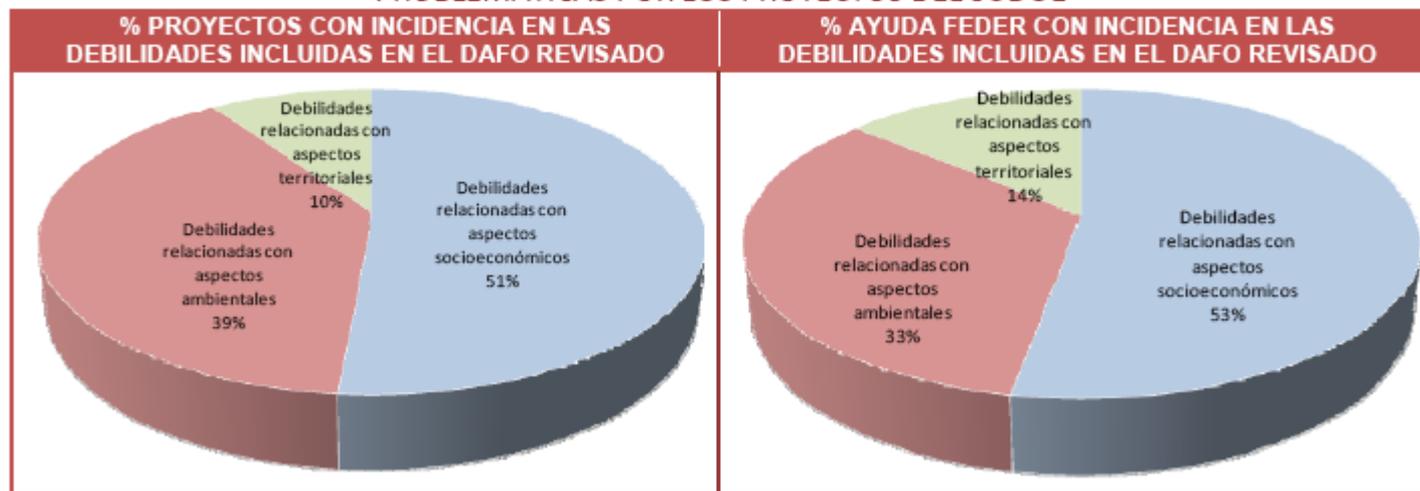


✦ EL ARRANQUE DEL PROGRAMA HA SIDO BASTANTE APROPIADO PARA AFRONTAR CON ÉXITO LOS PRINCIPALES RETOS DE LA ZONA DE COOPERACIÓN

## VALORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA:

- ✦ ELEVADA COHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA:
  - ✦ Avalada por los procedimientos de selección de operaciones, que garantizan su adecuación a los objetivos previstos en la programación.
  - ✦ Mayor atención dada a los proyectos con un potencial más elevado de generar valor añadido para las actividades productivas.
  - ✦ Gran capacidad de generación de sinergias.

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO FINANCIERO REALIZADO POR TIPO DE OBJETIVOS

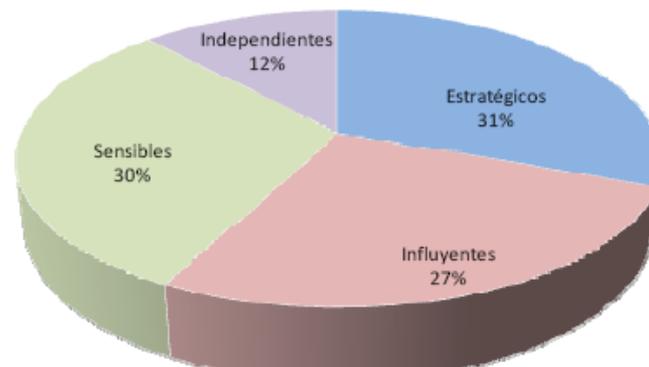


## VALORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA:

### IMPULSO DE LA ESTRATEGIA 2020:

- Crecimiento inteligente: actuaciones vinculadas con la innovación y el desarrollo de las TIC.
- Crecimiento sostenible: reducción de emisiones, impulso de las energías renovables y la modernización de los transportes de cara a un uso más eficiente de la energía.



GRÁFICO 9. AYUDA FEDER ORIENTADA A LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 2020

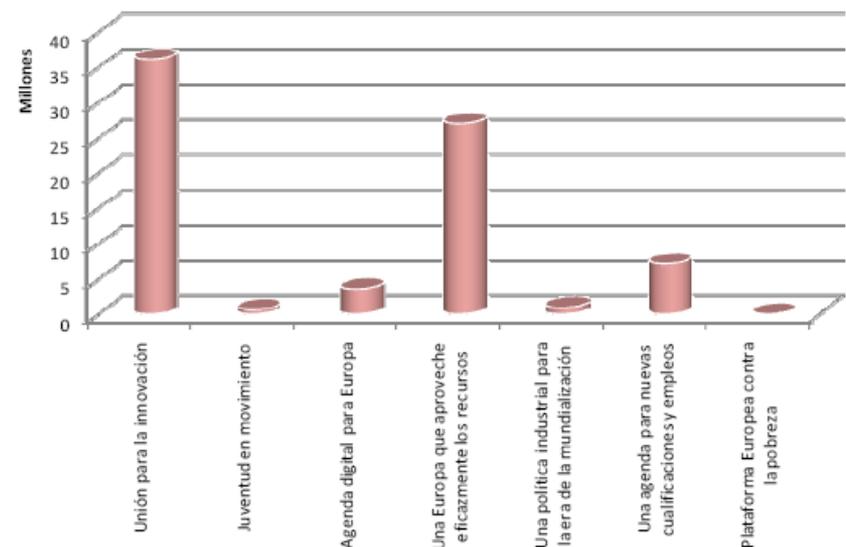



## AVANCE EN LA EJECUCIÓN:

✦ Grado de ejecución adecuado: Lanzamiento de 2 convocatorias. Gasto aprobado de 101 mill. € (76%)

✦ Incidencia de factores que han limitado un mayor avance:  
Retraso de la 1ª convocatoria y efectos de la crisis económica.

1ª CONV.	2ª CONV.
67.155.871,95	33.757.467,30

✦ Amplia participación institucional (s/ todo Admon. Regional y centros I+D)

✦ Mayor dinamismo de los Ejes Prioritarios 1 y 2, en términos de demanda y de capacidad de movilización de fondos.

(Datos a 1 de julio de 2011)

EJE	Coste aprobado (a)	Total gasto provisional (b)	Gasto Certificado (c)	Eficacia financiera	
				Total provisional de gasto sobre gasto aprobado (b/a)	Gasto Certificado sobre el coste aprobado (c/a)
1	23.796.035,45	13.439.797,50	4.371.897,24	56,48%	18,37%
2	16.963.674,12	10.593.471,94	3.048.132,44	62,45%	17,97%
3	16.162.829,07	6.773.263,43	1.563.991,43	41,91%	9,68%
4	10.233.333,32	4.281.962,10	1.274.559,82	41,84%	12,45%
<b>TOTAL</b>	<b>67.155.871,95</b>	<b>35.088.494,97</b>	<b>10.258.580,93</b>	<b>52,25%</b>	<b>15,28%</b>

## AVANCE EN LA EJECUCIÓN:

- ✦ Importante avance de los indicadores globales de ejecución física del Programa.

	INDICADOR	Acum.	Objetivo 2015	Eficacia física
1	Proyectos con implicación de, al menos, tres de los países que participan en el Programa (%)	82,43%	30%	274,77%
2	Redes de colaboración y partenariados creados (Nº)	74	45	164,44%
3	Redes de colaboración y partenariados establecidos con vocación de permanencia (Nº)	0	30	0,00%
4	Estrategias de desarrollo territorial formuladas conjuntamente (Nº)	10	30	33,33%
5	Regiones implicadas en las redes (%)	96,67%	75%	128,89%

- ✦ Se han registrado realizaciones, resultados e impactos en todas las Prioridades del Programa.
- ✦ Identificación de ligeras desviaciones.

## APROXIMACIÓN A LOS IMPACTOS GENERADOS:

---

- ✦ Los efectos microeconómicos y cualitativos superan ampliamente la escasa relevancia financiera de las acciones cofinanciadas.
- ✦ Se espera un mayor reflejo del impacto a medio y largo plazo (% de proyectos con un grado de maduración reducido)
- ✦ Valoración de la capacidad de influencia sobre el desarrollo económico es calificada como adecuada o muy alta por el 71% de los beneficiarios principales.
- ✦ Impulso de la cultura de cooperación, en particular en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico.
- ✦ Otros elementos de la gestión del Programa que aportan Valor Añadido Comunitario: adicionalidad, prioridades horizontales, sist. de seguimiento y evaluación, etc.

# MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

---

---

[felix.pablo@regioplus.eu](mailto:felix.pablo@regioplus.eu)

RegioPlus  
Consulting 

[www.regioplus.eu](http://www.regioplus.eu)

C/ San Felipe Neri 3  
28801 Alcalá de Henares-Madrid  
T. +34 91 883 80 08  
F. +34 91 879 88 19

Rue Louis Scutenaire 7/8  
B-1030 Bruselas  
T. +32 (0) 2 742 25 80
